

# PROGRESS UPDATE

**Bell Road, 31st Street to 32nd Street**

- 66" diameter pipeline installation completed.

**31st Street Booster Pump Station**

- Booster pump station is under construction and scheduled to be completed in late December 2022.

**31st Street, Bell Road to Greenway Road**

- 66" diameter pipeline installation completed.

**Greenway Road, 31st Street to 32nd Street**

- 66" diameter pipeline installation completed.

**32nd Street, Greenway Road to Acoma Drive:**

- 66" diameter pipeline under construction and is scheduled to last 3-5 months.

**32nd Street, Acoma Drive to Thunderbird Road:**

- 66" diameter pipeline installation scheduled to start in summer 2022 and last 3-5 months.

**32nd Street, Thunderbird Road to Cactus Road**

- 66" diameter pipeline installation completed.
- Minor construction in the area of 32nd Street and Thunderbird Road is scheduled to return in early summer 2022 for approximately 2 weeks.
- Traffic restrictions will return to 32nd Street, Sweetwater Avenue to Thunderbird Road in late summer 2022 to connect the 66" diameter pipeline from the north and for the installation of a 42" diameter interconnect pipeline.

**32nd Street, Cactus Road to Cholla Street**

- 66" diameter pipeline under construction and scheduled to last 3-4 months.
- Pipeline installation will move from east side of 32nd Street (northbound lanes) to the west side of 32nd Street (southbound lanes). Traffic will remain one lane in each direction but will be moved to the east side of 32nd Street.
- Construction at 32nd Street and Cactus Road is scheduled to return in early summer for approximately three week to install a sewer bypass line.

**32nd Street, Cholla Street to Shea Boulevard**

- 66" diameter pipeline installation scheduled to start in late summer 2022 and last 3-5 months.

**32nd Street and Shea Boulevard**

- Tunneling operation under construction and is scheduled to take 3-4 months.
- 66" diameter pipeline installation from the south and from the north meet south of 32nd Street and Shea Boulevard. Pipeline installation in this area will continue for 6-8 months.

**32nd Street, Cheryl Drive to Shea Boulevard**


- 66" diameter pipeline installation scheduled to start in early fall 2022 and last 2-3 months.


**26th Street and Northern Avenue (Tunneling under the SR51)**


- Tunneling operation under construction and is scheduled to last 3-4 months.

**26th Street and Northern Avenue to 32nd Street and Cheryl Drive**


- 66" diameter pipeline installation at the bore pit near 26th Street on Northern Avenue heading north toward Cheryl Drive is scheduled to start in May 2022 and last 3-4 months.

**Completed Pipeline** 

**Construction Area** 

**Future Pipeline** 

# NOTICIAS DEL PROGRESO

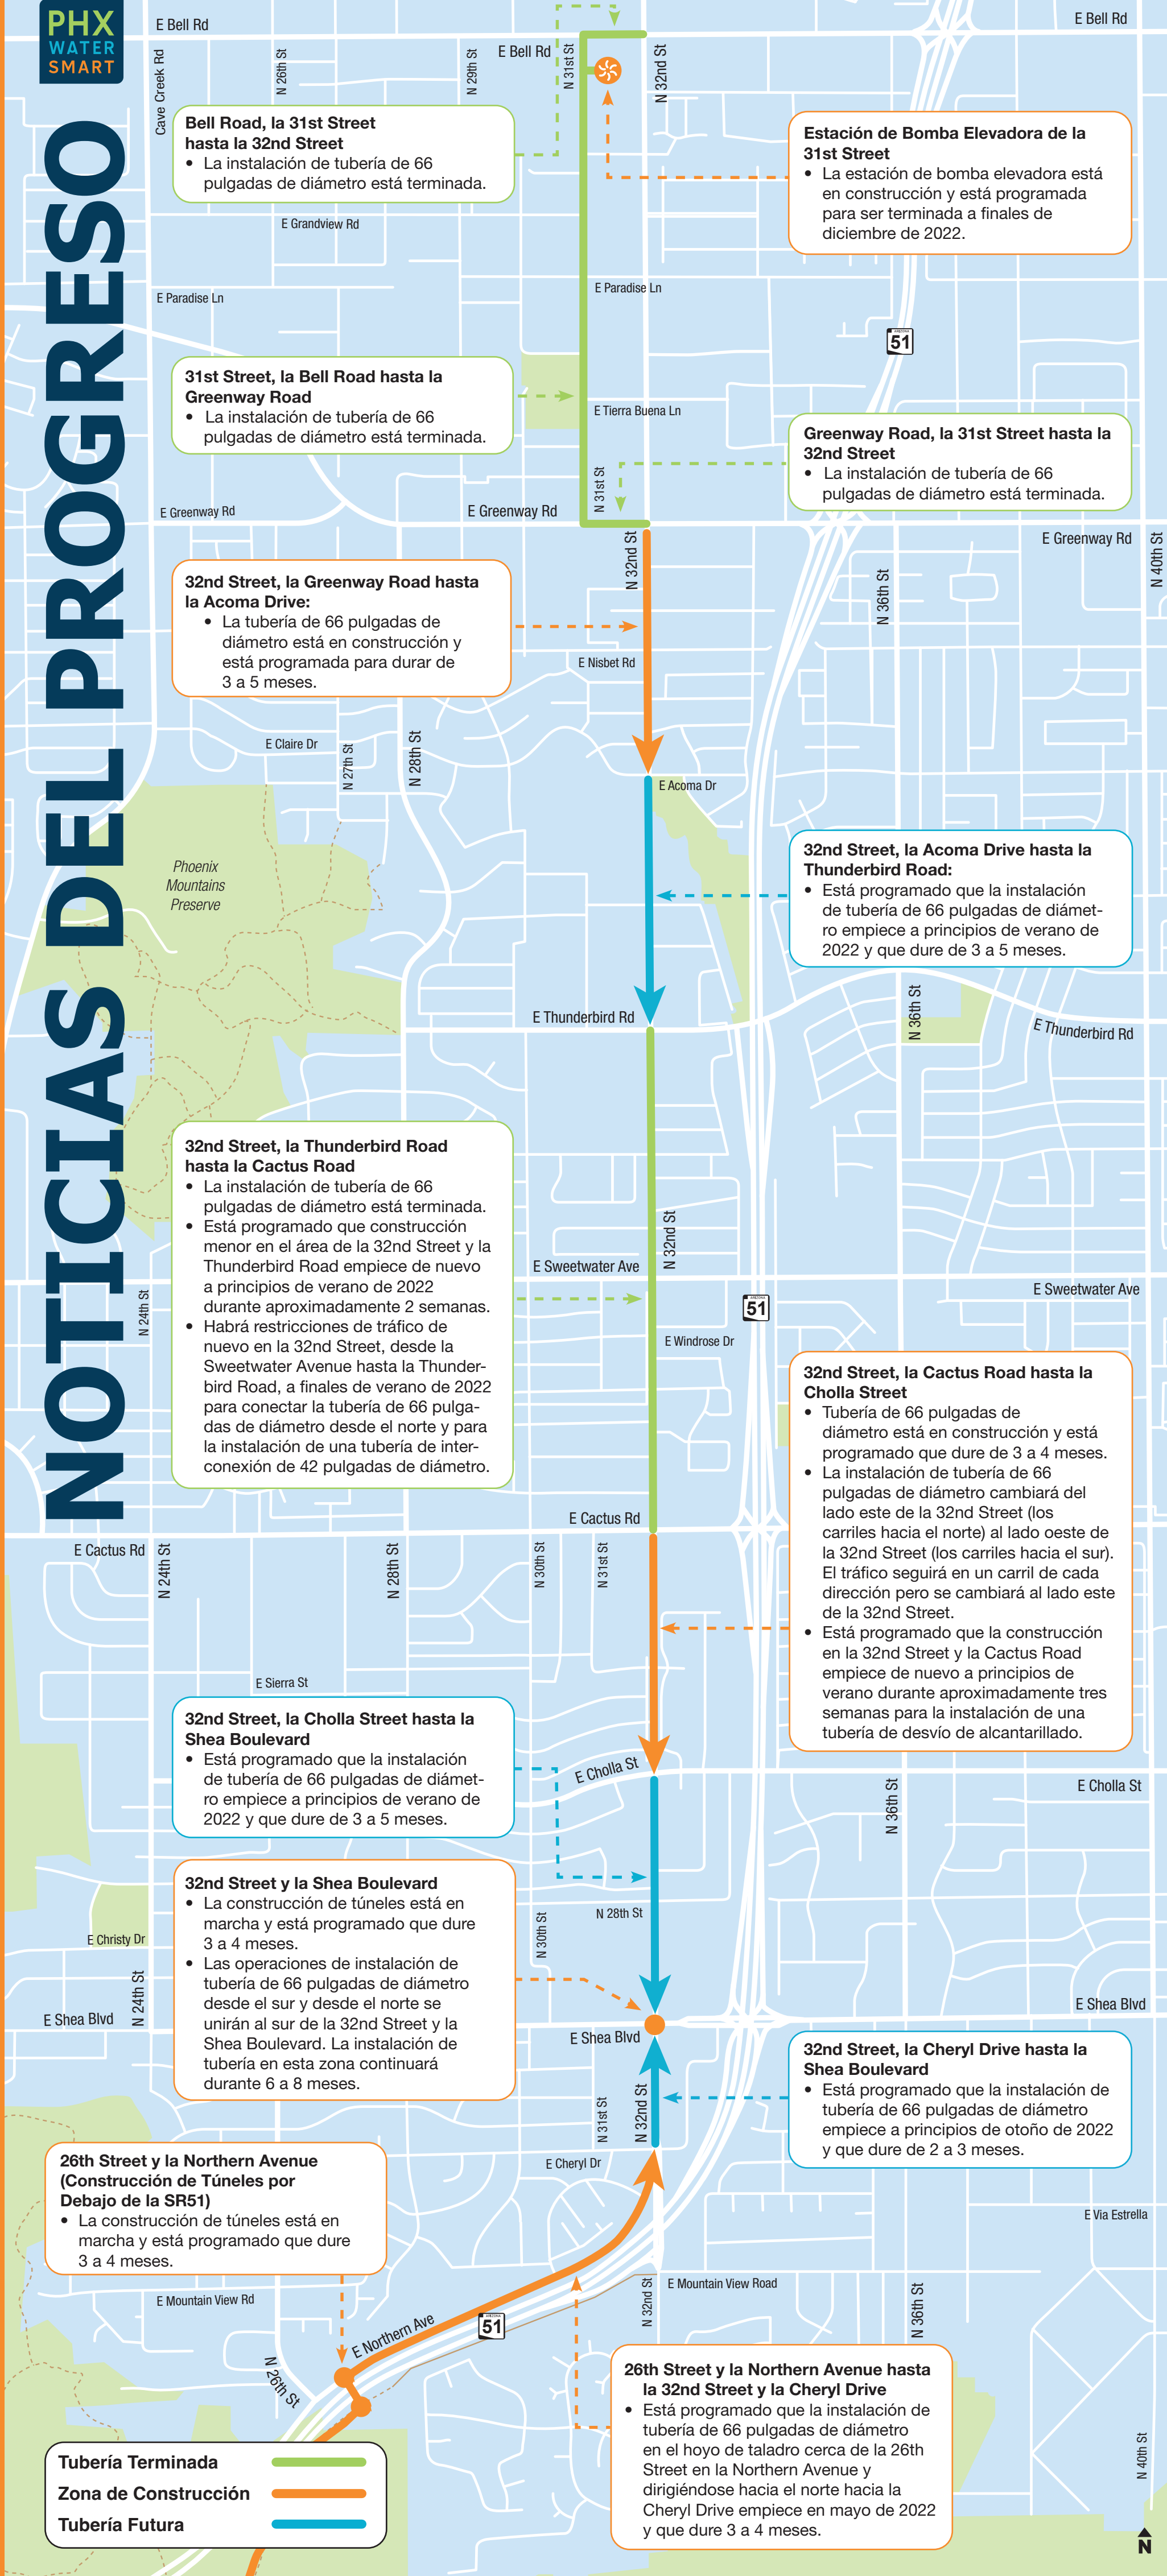

**Bell Road, la 31st Street hasta la 32nd Street**

- La instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro está terminada.

**Estación de Bomba Elevadora de la 31st Street**

- La estación de bomba elevadora está en construcción y está programada para ser terminada a finales de diciembre de 2022.

**31st Street, la Bell Road hasta la Greenway Road**

- La instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro está terminada.

**Greenway Road, la 31st Street hasta la 32nd Street**

- La instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro está terminada.

**32nd Street, la Greenway Road hasta la Acoma Drive:**

- La tubería de 66 pulgadas de diámetro está en construcción y está programada para durar de 3 a 5 meses.

**32nd Street, la Acoma Drive hasta la Thunderbird Road:**

- Está programado que la instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro empiece a principios de verano de 2022 y que dure de 3 a 5 meses.

**32nd Street, la Thunderbird Road hasta la Cactus Road**

- La instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro está terminada.
- Está programado que construcción menor en el área de la 32nd Street y la Thunderbird Road empiece de nuevo a principios de verano de 2022 durante aproximadamente 2 semanas.
- Habrà restricciones de tráfico de nuevo en la 32nd Street, desde la Sweetwater Avenue hasta la Thunderbird Road, a finales de verano de 2022 para conectar la tubería de 66 pulgadas de diámetro desde el norte y para la instalación de una tubería de interconexión de 42 pulgadas de diámetro.

**32nd Street, la Cactus Road hasta la Cholla Street**

- Tubería de 66 pulgadas de diámetro está en construcción y está programado que dure de 3 a 4 meses.
- La instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro cambiará del lado este de la 32nd Street (los carriles hacia el norte) al lado oeste de la 32nd Street (los carriles hacia el sur). El tráfico seguirá en un carril de cada dirección pero se cambiará al lado este de la 32nd Street.
- Está programado que la construcción en la 32nd Street y la Cactus Road empiece de nuevo a principios de verano durante aproximadamente tres semanas para la instalación de una tubería de desvío de alcantarillado.

**32nd Street, la Cholla Street hasta la Shea Boulevard**

- Está programado que la instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro empiece a principios de verano de 2022 y que dure de 3 a 5 meses.

**32nd Street y la Shea Boulevard**

- La construcción de túneles está en marcha y está programado que dure 3 a 4 meses.
- Las operaciones de instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro desde el sur y desde el norte se unirán al sur de la 32nd Street y la Shea Boulevard. La instalación de tubería en esta zona continuará durante 6 a 8 meses.

**32nd Street, la Cheryl Drive hasta la Shea Boulevard**

- Está programado que la instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro empiece a principios de otoño de 2022 y que dure de 2 a 3 meses.

**26th Street y la Northern Avenue (Construcción de Túneles por Debajo de la SR51)**

- La construcción de túneles está en marcha y está programado que dure 3 a 4 meses.

**26th Street y la Northern Avenue hasta la 32nd Street y la Cheryl Drive**

- Está programado que la instalación de tubería de 66 pulgadas de diámetro en el hoyo de taladro cerca de la 26th Street en la Northern Avenue y dirigiéndose hacia el norte hacia la Cheryl Drive empiece en mayo de 2022 y que dure 3 a 4 meses.

**Tubería Terminada** —

**Zona de Construcción** —

**Tubería Futura** —
